

Viccari

Construtora e Engenharia

GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - CLEVELÂNDIA LTDA ME

CNPJ: 09.004.287/0001-00 - inscrição estadual: 90.413.430-92

ENDEREÇO - Barão do Rio Branco nº 2416 - Centro, Clevelândia/PR

TELEFONE 46 3252-3627

EMAIL: marcia_viccari@hotmail.com

Ilmo Srº Prefeito Municipal do Município de Quilombo SC.

Ofício nº001/2022 -

Referente a Tomada de Preços nº 42/2020 e o

Contrato Administrativo 83/2020

A empresa acima citada, através de seu representante legal GECIR VICCARI inscrito com CPF [REDACTED] e sua responsável Técnica Engª Civil Márcia Viccari CREA SC 766418/D, vem através deste informar desistência do restante faltante da obra sob contrato nº 83/2020. Segue abaixo motivos para desistência:

1º A empresa não pode ficar no prejuízo e a execução dos serviços faltantes constantes em planilha são incompatíveis com aumento abusivo que o mercado vem sofrendo. O combustível sobe a cada mês e os valores dos produtos juntamente com ele, não podendo o preço ser mantido em toda a obra. Em 29 de Junho de 2021, a empresa solicitou um reequilíbrio de preços e verificação na ausência de Paver Tátil e direcional alerta, mas foi atendida parcialmente no que diz respeito a valores e diferenciação de material, tendo em vista que está orçado somente o item : EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. Continuamos os serviços para cumprir com a obrigação legal da empresa, mas o prejuízo se confirmou no decorrer da obra, tendo em vista que o projeto não é condizente com o orçamento.

2º O trecho onde os serviços de calçadas em paver faltam ser executados não foi totalmente liberado pela prefeitura, não tendo condições de execução em algumas partes, pois a largura é insuficiente para execução do passeio(foto em anexo). No item 12.2 do contrato, motivos para rescisão do contrato: letra (p): A não liberação, por parte do CONTRATANTE, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como fontes de materiais naturais especificadas em projeto;. Tendo em vista que a empresa só recebe medição e valor após 100% do serviço concluído.

3º O prazo de execução do contrato vence no mês de Julho de 2022 e não temos tempo hábil para executar tal serviço.

Viccari

Construtora e Engenharia

GE CIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - CLEVELÂNDIA LTDA ME

CNPJ: 09.004.287/0001-00 - inscrição estadual: 90.413.430-92

ENDEREÇO - Barão do Rio Branco nº 2416 - Centro, Clevelândia/PR

TELEFONE 46 3252-3627

EMAIL: marcia_viccari@hotmail.com

A empresa conclui o serviço, um carro entorta e danifica meio fio, a erosão causa danos a estrutura, por parte dos declives acentuados existentes no município, o setor de engenharia não realiza a medição até total execução dos serviços, resumindo quem fica sem receber 100% dos serviços por motivos aleatórios e externos é a empresa, sendo esse um trecho com muitos problemas com moradores, arruamento, pedras salientes, barrancos acentuados, entre outros.

Como citado anteriormente sobre a impossibilidade da contratada em manter as condições efetivas da proposta, aplicando a teoria da imprevisão, devido a todo acontecimento externo ao contrato, estranho à vontade das partes, imprevisível e inevitável, que causa um desequilíbrio muito grande, tornando a execução do contrato excessivamente onerosa para o contratado que já está suportando prejuízos financeiros. **Requer através deste, rescisão contratual com consentimento das partes, e sem prejuízo maior a empresa**, baseado no Parágrafo 6 Artigo 43 da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993: "Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão".


Atenciosamente



Márcia Viccari

Responsável Técnica

Eng^a Civil CREA SC 766418/D



Gecir Viccari

Proprietário

CPF [REDACTED]

Clevelândia, 23 de Junho de 2022.

Viccari

Construtora e Engenharia

GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - CLEVELÂNDIA LTDA ME


CNPJ: 09.004.287/0001-00 - inscrição estadual: 90.413.430-92

ENDEREÇO - Barão do Rio Branco nº 2416 - Centro, Clevelândia/PR

TELEFONE 46 3252-3627

EMAIL: marcia_viccari@hotmail.com

Anexos

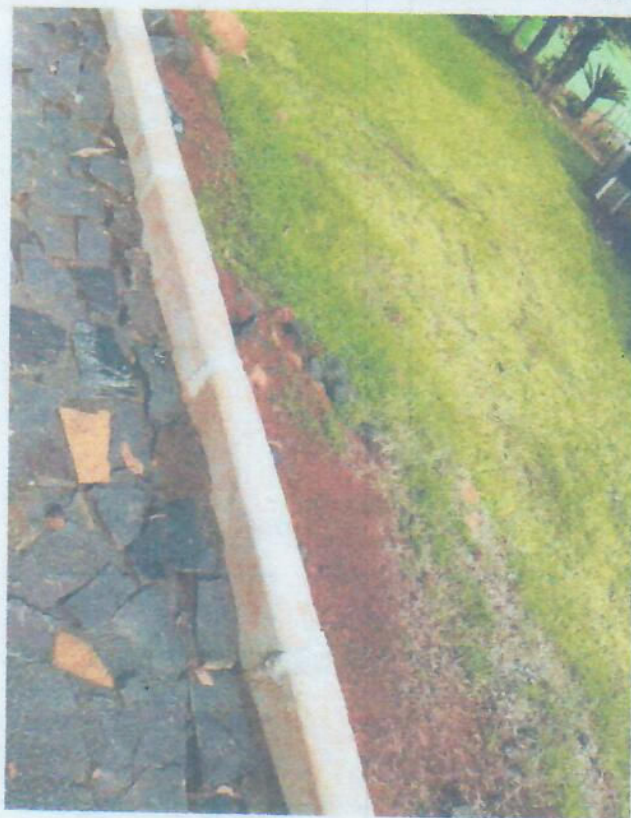

Talude Acentuado adentro dos terrenos.

[Handwritten signature]

Viccari

Construtora e Engenharia

GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - CLEVELÂNDIA LTDA ME

CNPJ: 09.004.287/0001-00 - inscrição estadual: 90.413.430-92

ENDEREÇO - Barão do Rio Branco nº 2416 - Centro, Clevelândia/PR

TELEFONE 46 3252-3627

EMAIL: marcia_viccari@hotmail.com



Entrada irregular de veículo, causando prejuízos constante para empresa

[Handwritten signature]

Viccari

Construtora e Engenharia


GE CIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - CLEVELÂNDIA LTDA ME

CNPJ: 09.004.287/0001-00 - inscrição estadual: 90.413.430-92

ENDEREÇO - Barão do Rio Branco nº 2416 - Centro, Clevelândia/PR

TELEFONE 46 3252-3627

EMAIL: marcia_viccari@hotmail.com

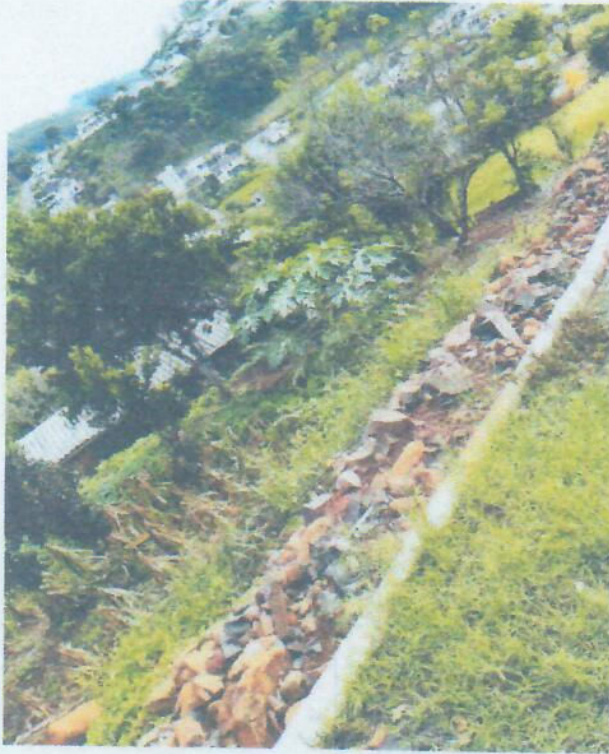

Seria necessário muro de contenção ou aterramento em largura superior ao da calçada em alguns trechos para não ocasionar erosão na viga de concreto e piso intertravado(paver).

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]
